



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

Edificación

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 33^{er} PUL. AZTECA" **Operado 33**
 Domicilio: CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 33^{er} PUL. AZTECA
 Localidad: LEÓN, GTO.
 Contratista: CONSTRUCTORA HOKI S.A DE C.V.
 Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-3110-2015 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es federal, no es de ningún partido político. Queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de propaganda." Queda gram.

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-5051-K100310-61401-D/0061/2025	de fecha	31 DE MARZO DE 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 3,428,416.64		
Inicio S/Contrato:	14-abr-25	Inicio real:	14-abr-25
Término S/Contrato:	02-ago-25	Término real:	20-sep-25
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	20-sep-25	Autorización según:	DGOP/CT/PR/244/2025
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$ 567,890.64	de fecha	11 DE JUNIO DE 2025
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 3,996,307.28		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$3,996,307.28

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra García
Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
Director de Supervisión de Obra

Ing. Ingrid del Rosario Gómez Reyes
Supervisión Interna DGOP

Ing. Margarita Pérez Cabrera
Supervisión externa

Por el Contratista

Lic. Martha Fabiola Moreno López
CONSTRUCTORA HOKI S.A DE C.V.

Omar G. Velázquez Navarro
Fidoc

Por el (los) órgano(s) de control

Edal Alonso Hernández Ruiz

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar: Dir. De Administración y Control Financiero de Obra
 Fecha: 03/12/2025
 Hora: 10:40 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 13 de Octubre de 2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y SErvicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclams pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6", RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA. CONTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS CON BISAGRAS DE FO.FO. DE 40 X 60 CM. REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTALE DE 3" Y DE 4" DE DIAMETRO A BASE DE TUBERIA DE PVC. CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO KITEC DE 1/2". VALVULA DE INSECCION KITEC, BASTON GALV. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL PARA EXCAVACION Y CARGA EN MATERIAL TIPO "B" PARA APERTURA DE CAJA, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONCRETO ASFALTICO, ACARREO EN CAMION, UNA CAPA DE PEDRAPLEN DE 40 CMS, SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM. EN UN ESPESOR DE 30 CMS.UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO RIGIDO DE 20 CMS DE ESPESOR. PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. A 28 DIAS DE MR=42 KG/CM2 Y 16 CMS DE ESPESOR. SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES CON MASILLA AUTONIVELANTE, POLIURETANO ELASTOMERICO. CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA BANQUETAS DE CONCRETO CONSISTENTE EN AFINE Y COMPACTACION, DE TERRENO NATURAL AL 90% DE PVSM. BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONRETO PREMEZCLADO DE F' C=200 KG/CM2 TMA DE 3/4", CONSTRUCCION DE CENEFA DE 40 CMS DE ANCHO CON CONCRETO PREM. F' C=200 KG/CM2 ESTAMPADO EN COLOR ROJO, SELLADO DE JUNTAS LONG. ENTRE LA GUARNICION Y LA BANQUETA CON MASILLA AUTONIVELANTE, SUMINISTO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL. PODA DE ARBOLES DE DIFEENTES ESPECIES Y TAMAÑOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 9 MTS. CON NSTALACION DE LUMINARIA MODELO ROADFOCUS PLUS SMALL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL PREFABRICAJO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 MTS. SUMIN Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED MARCA CONSTRULITA .

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificacioens generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		Afianzadora		TOKIO MARINE HCC	
Número	111969-00000	Fecha	31/03/2025	Monto	\$ 1,198,892.18
De cumplimiento		Afianzadora		TOKIO MARINE HCC	
Número	111975-00000	Fecha	31/03/2025	Monto	\$ 399,630.72
De vicios ocultos		Afianzadora		TOKIO MARINE HCC	
Número	127025-00000	Fecha	13/10/2025	Monto	\$ 394,564.56

Observaciones existentes

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Ramo
1	De: 14/04/2025 A: 30/04/2025	\$37,613.97			Operado 33 2025
2	De: 01/05/2025 A: 31/05/2025	\$434,219.80			
3	De: 01/06/2025 A: 30/06/2025	\$740,787.74			
4	De: 01/JUL/2025 A: 31/07/2025	\$564,736.88			

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
 permitida su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

5	De: 01/AGO/2025	\$932,695.47			
	A: 31/AGO/2025				
6 ÚLTIMA	De: 01/SEP/2025	\$1,235,591.71			
	A: 20/SEP/2025				
	De:				
	A:				
	De:				
	A:				

Subtotal	\$3,945,645.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,945,645.57
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			


Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:	F.CAT.			
	A:	V. EXC			

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$3,945,645.57
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$50,661.71

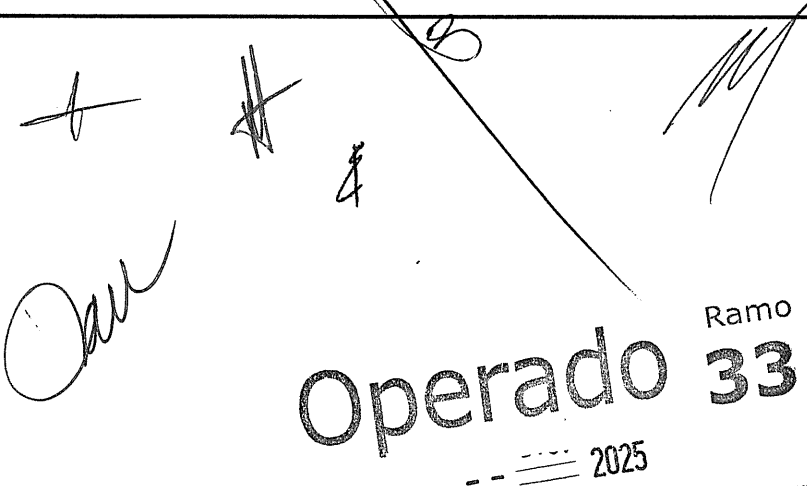

Operado 33

 --- 2025

Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
